



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

**INFORME DE SEGUIMIENTO GPR DEL MES DE
NOVIEMBRE**



Quito, Diciembre 2014

CONTENIDO

ANTECEDENTES	1
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	1
ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS.....	1
ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES.....	2
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	2
ESTADO DE PROYECTOS	2
ESTADO DE INDICADORES	5
ESTADO DE PROCESOS	11
RESUMEN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA.....	17
RECOMENDACIONES.....	21

INFORME DE SEGUIMIENTO GPR NOVIEMBRE

ANTECEDENTES

Ante la necesidad de establecer lineamientos para la actualización de información en GPR, se presentó a la Gerencia de Planificación una propuesta de memorando para ser remitido a las áreas, a fin de organizar el seguimiento a la actualización de la ejecución de proyectos y del plan estratégico. La Gerencia de Planificación remitió a los Gerentes el memorando EEQ-GPL-2014-0154-ME con fecha 9 de abril de 2014, que en resumen establece lo siguiente:

Actividades y plazos	Actualización y cierre de resultados		Elaboración informes por área		Elaboración informes EEQ	
	Plazo	Responsables	Plazo	Responsables	Plazo	Responsable
Actualización mensual de la información de proyectos	Hasta los cuatro (4) primeros días del mes subsiguiente	Líderes de proyectos	Día cuatro (4) de cada mes a partir de las 12h00	Equipo Metodológico de cada área	Día cinco (5) de cada mes	Líder Metodológica GPR EEQ
Actualización mensual del plan estratégico	Día catorce (14) de cada mes	Responsables de indicadores	Día catorce (14) de cada mes a partir de las 12h00	Equipo Metodológico de cada área	Día quince (15) de cada mes	Líder Metodológica GPR EEQ

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

El 4 de noviembre de 2014, a través del Visor de Gestión de GPR, se obtiene el reporte de las novedades en actualización de proyectos de inversión como de gasto corriente, con los siguientes resultados:

Área	Avance Físico Actualizado	Avance Financiero Actualizado	Indicadores Actualizados	Fecha de última actualización
DCS	1			2
DSPA				
GAF	1			
GC				
GD	1	1		
GGs	1	2		
GPE	3			1
GPL				
PR				
Total general	7	3		3

GPR reporta durante este mes, proyectos con retraso: siete en el avance físico, tres en el avance financiero y tres en resúmenes ejecutivos.

ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES

Según los lineamientos para el seguimiento de indicadores de la EEQ, se obtuvo el reporte de actualización con los siguientes resultados:

- A=Indicadores vigentes en 2014: **186**
- B=Indicadores que deberían estar actualizados: **175**
- C=Indicadores actualizados: **175**
- D=Indicadores con atraso encontrados: **0**
- E=Porcentaje de incumplimiento ($D / B \times 100$): **0.00 %**


ANÁLISIS DE RESULTADOS

ESTADO DE PROYECTOS



Proyectos por área

La información reportada por GPR en el mes de noviembre presento 38 proyectos en riesgo de un total de 153 proyectos de la Empresa, es decir representan el 20 % del total de proyectos de la EEQ. La razón principal por la cual estos proyectos se encuentran en riesgo es el semáforo presupuestal en rojo.

Proyectos en riesgo

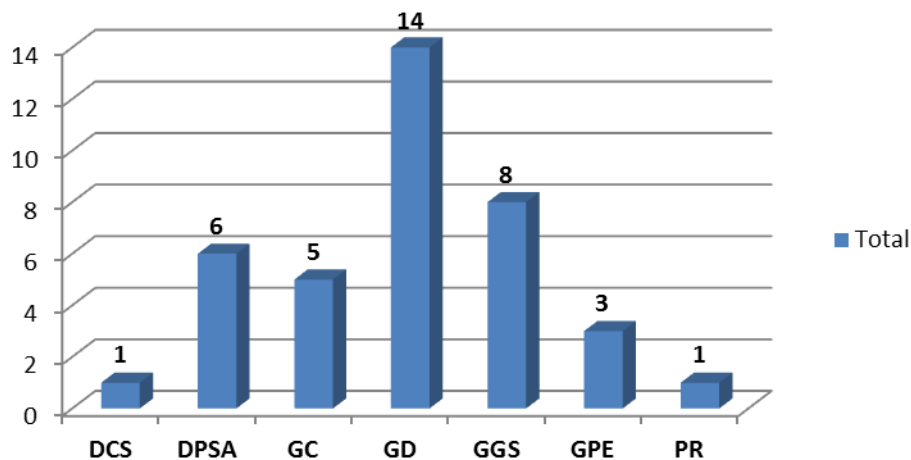


Proyectos en riesgo - causas

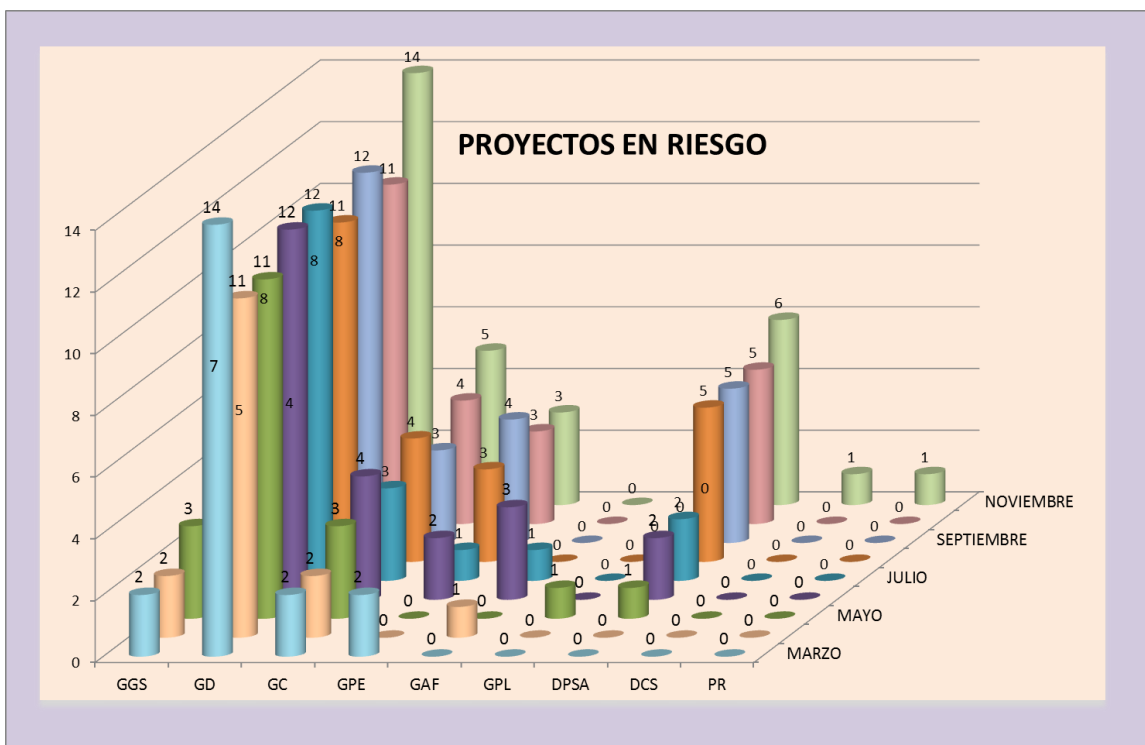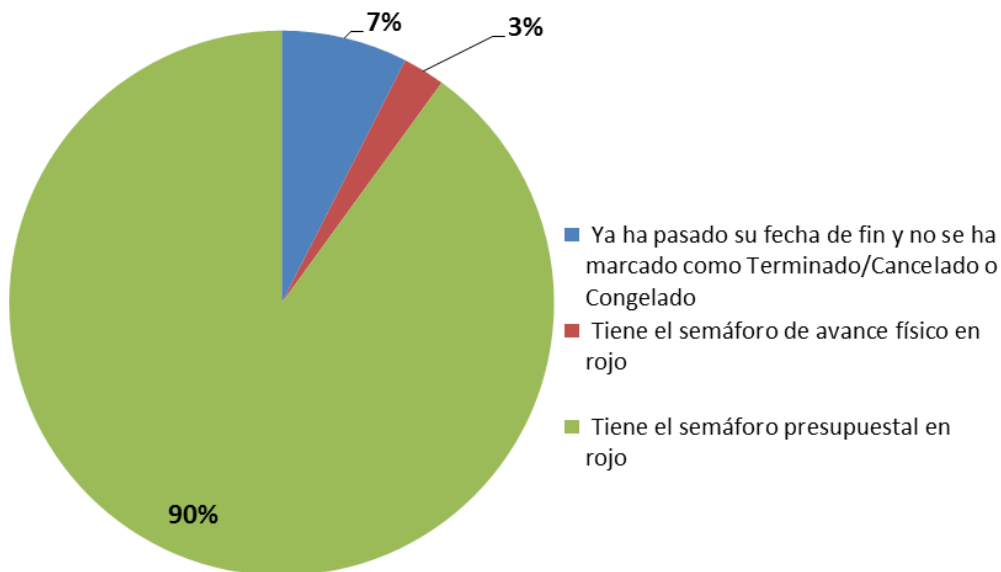

ÁREA	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GGS	2	2	3	7	5	8	4	8	8	0	0%
GD	14	11	11	12	12	11	12	11	14	3	2%
GC	2	2	3	4	3	4	3	4	5	1	1%
GPE	2	0	0	2	1	3	4	3	3	0	0%
GAF	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0%
GPL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
DPS	0	0	1	2	2	5	5	5	6	1	1%
DCS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
PR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
Tota	20	16	19	30	24	31	28	31	38	7	5%

En relación al mes anterior, hay un incremento del 5% de proyectos en riesgo, lo que refleja una tendencia durante el año que se resume en el siguiente gráfico.

Proyectos en riesgo - tendencia

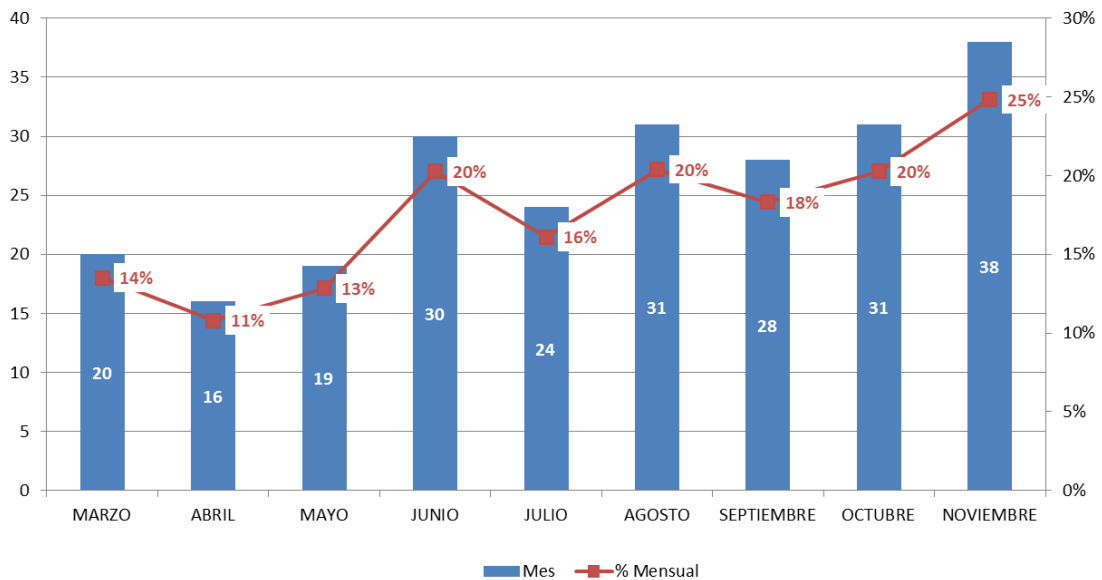


ESTADO DE INDICADORES

Indicadores por área

La EEQ ha declarado 186 indicadores en GPR de acuerdo a la siguiente distribución:

ÁREA	NOVIEMBRE	%	% ACUMULADO
N1	30	16%	16%
Gerencia de Generación y Subtransmisión	15	8%	24%
Gerencia de Distribución	28	15%	39%
Gerencia de Comercialización	39	21%	60%
Gerencia de Planificación	22	12%	72%
Gerencia Administrativa Financiera	36	19%	91%
Gerencia de Proyectos Especiales, ER EE	10	5%	97%
Dirección de Participación Socio Ambiental	3	2%	98%
Dirección de Comunicación Social	1	1%	99%
Procuraduría	2	1%	100%
TOTAL	186	100%	

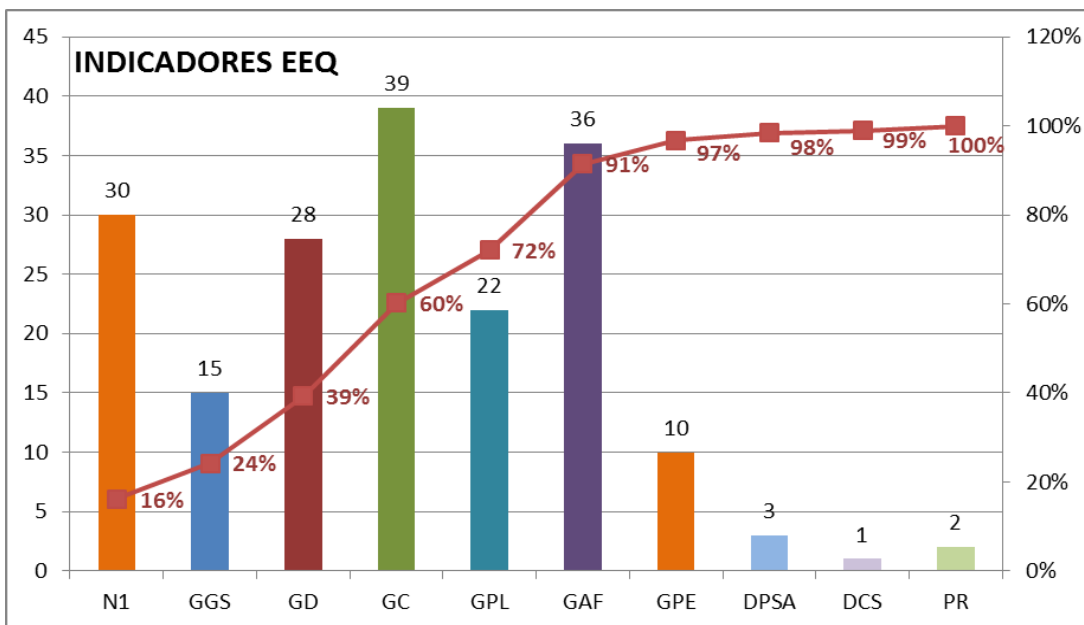

Estado de los semáforos de indicadores

La Norma Técnica de Implementación y Operación de Gobierno por Resultados en su Artículo 6, sobre semáforos de los indicadores establece:


“Semáforos o alertas de indicadores: la herramienta GPR cuenta con un sistema de semáforos o alertas asociados a los indicadores que facilitan su gestión. Los semáforos se muestran en GPR con íconos que tienen el siguiente significado:

- *Semáforos verdes: representan resultados aceptables en comparación a sus metas, dentro de los rangos establecidos y con bajo riesgo.*

- *Semáforos amarillos: representan alertas de mediano riesgo y requieren evaluación, monitoreo y posibles acciones preventivas o correctivas*
- *Semáforos rojos: representan alertas de alto riesgo con resultados inaceptables en comparación a sus metas y deberían ser priorizados para acciones correctivas o planes de mejora inmediata”*

El reporte de estado de los indicadores de la EEQ presenta la siguiente situación en comparación con el mes anterior:


ESTADO	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	% NOV	DIF	% DIF
Verde	109	114	121	127	129	127	123	127	123	66%	-4	-2%
Amarillo	26	16	16	16	17	20	28	24	27	15%	3	2%
Rojo	36	41	34	32	29	28	24	24	25	13%	1	1%
Sin información	15	15	15	11	11	11	11	11	11	6%	0	0%
Total	186	186	186	186	186	186	186	186	186	100%	0	0%

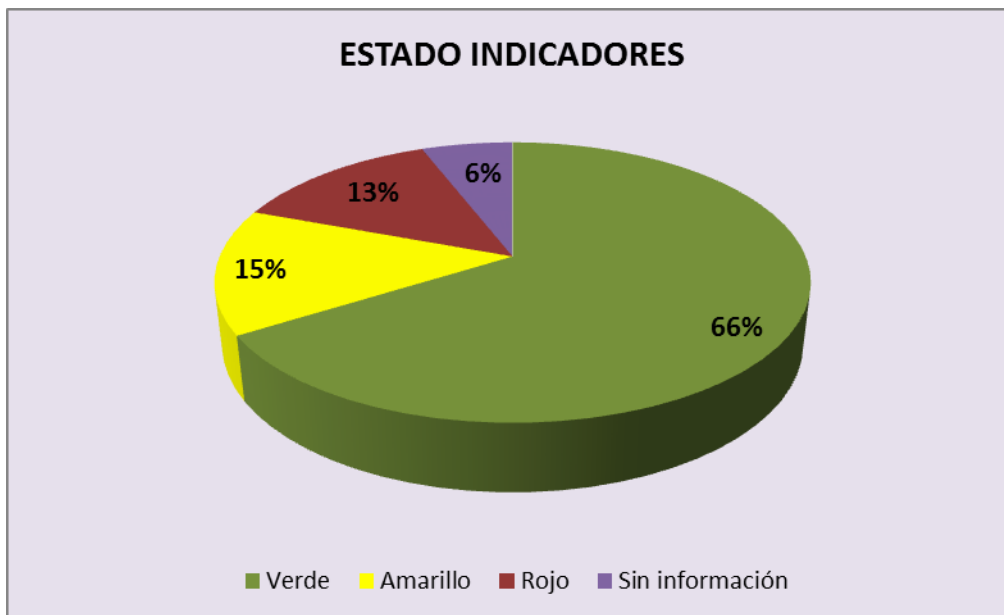


La grafica indica que el 66% de los indicadores registran resultados aceptables en relación a sus metas, el 15% tiene mediano riesgo y requiere evaluación y que el 13% tiene alto riesgo y resultados inaceptables, mientras que el 6% no tiene información.

Entre los indicadores cuyo estado se encuentra en verde, la distribución por áreas y la situación comparativa con relación al mes anterior es la siguiente:

ÁREA	NOV	%	OCT	SEPT	AGOS	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	DIF
N1	23	19%	22	21	23	23	22	19	17	17	1
GGs	7	6%	7	5	5	9	9	8	6	6	0
GD	14	11%	15	15	16	16	16	16	16	16	-1
GC	34	28%	35	34	35	36	36	34	36	31	-1
GPL	16	13%	16	16	18	18	16	13	13	10	0
GAF	16	13%	19	18	17	14	15	20	15	18	-3
GPE	10	8%	10	10	10	10	10	8	8	8	0
DPSA	2	2%	2	2	2	2	2	2	2	2	0
PR	1	1%	1	1	1	1	1	1	1	1	0
TOTAL	123	100%	127	122	127	129	127	121	114	109	-4

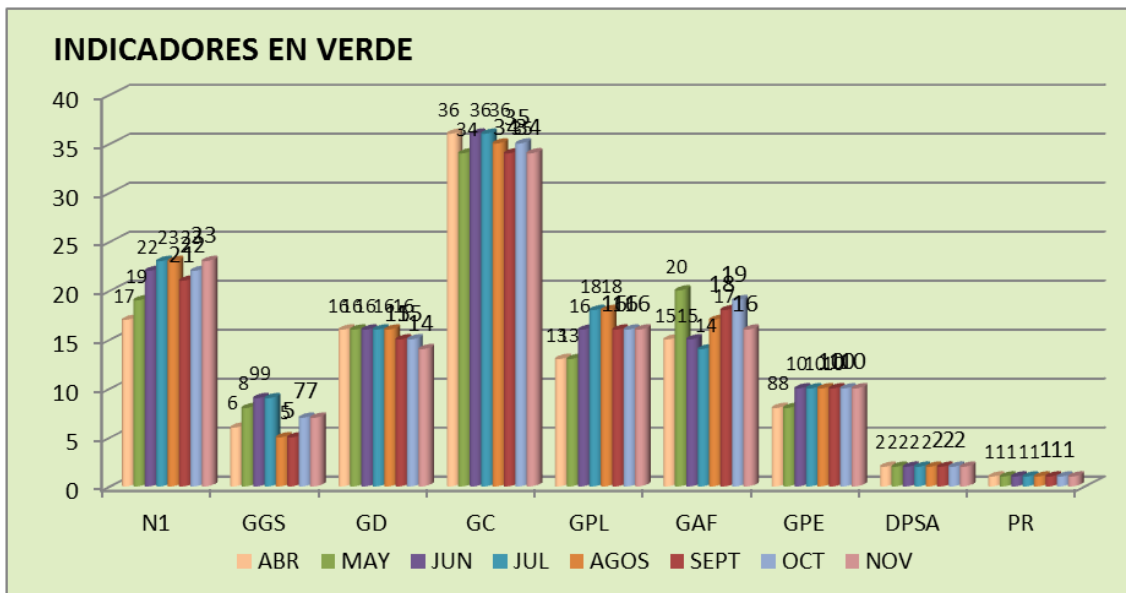


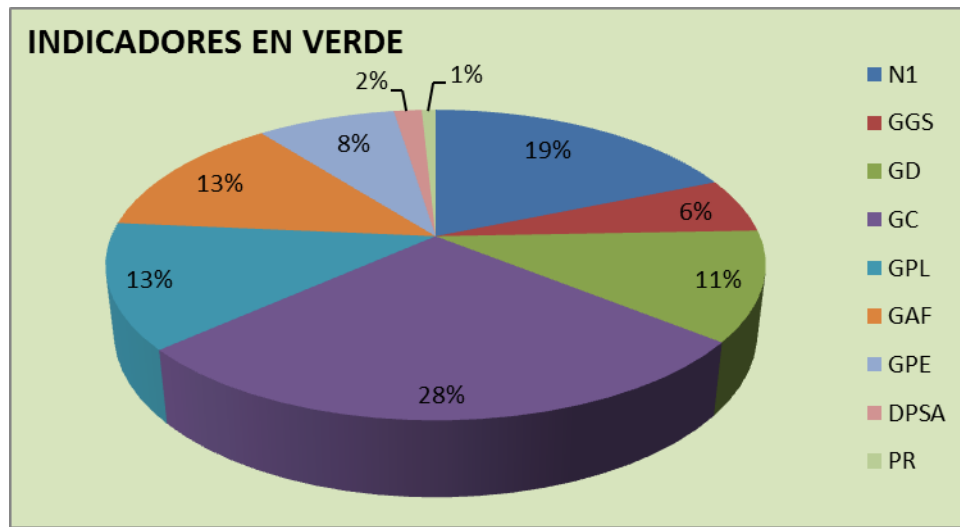


Entre los indicadores cuyo estado se encuentra en amarillo, la distribución por áreas y la situación comparativa con relación al mes anterior es la siguiente:

ÁREA	NOV	%	OCT	SEPT	AGOS	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	DIF
N1	3	11%	4	4	3	2	2	3	3	4	-1
GGS	6	22%	6	8	6	4	4	2	2	4	0
GC	5	19%	4	5	4	3	3	5	3	8	1
GPL	4	15%	2	2	0	0	0	3	3	6	2
GAF	6	22%	5	6	5	6	0	0	2	1	1
GD	1	4%	1	1	0	0	0	0	0	0	0
GPE	0	0%	0	0	0	0	0	2	2	2	0
PR	1	4%	1	1	1	1	1	1	1	1	0
DPSA	1	4%	1	1	1	1	1	0	0	0	0
TOTAL	27	100%	24	28	20	17	11	16	16	26	3

INDICADORES EN AMARILLO


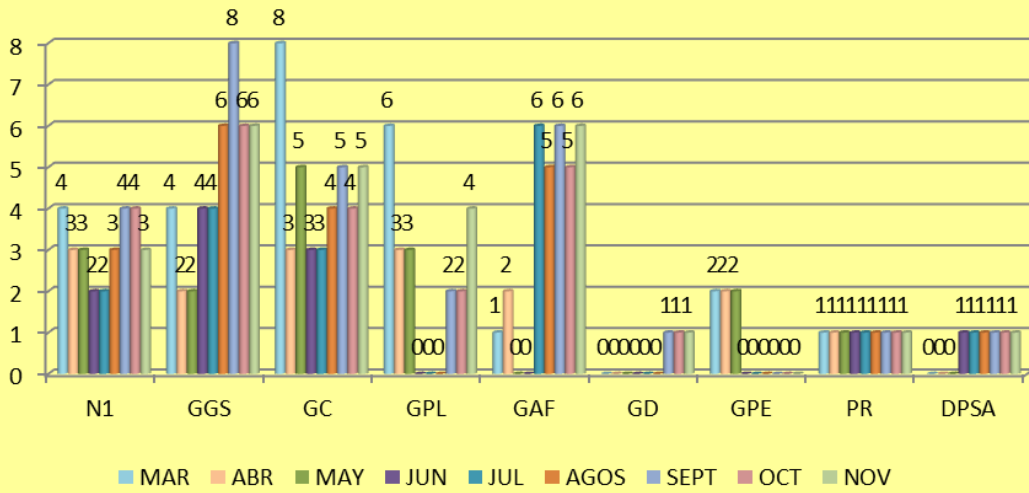


INDICADORES EN AMARILLO

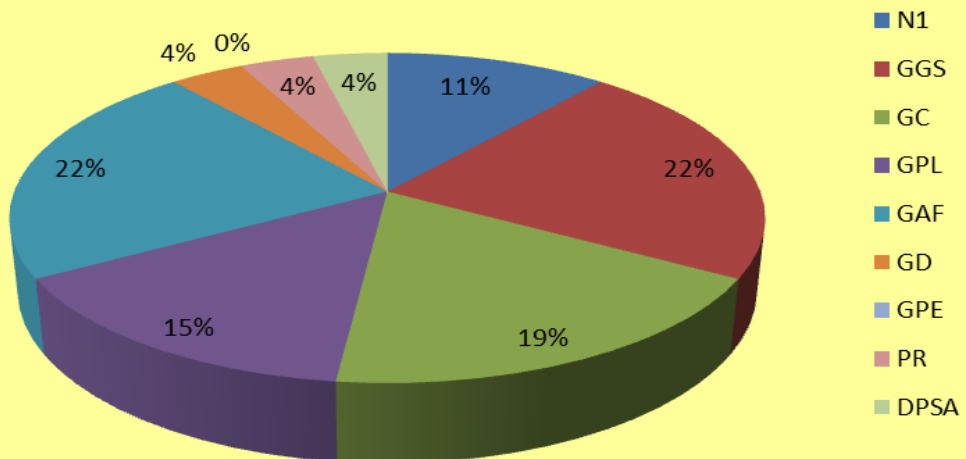

Entre los indicadores cuyo estado se encuentra en rojo, la distribución por áreas y la situación comparativa con relación al mes anterior es la siguiente:

ÁREA	NOV	%	OCT	SEPT	AGOS	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	DIF
N1	5	20%	5	5	5	6	7	7	9	8	0
GGS	2	8%	2	2	4	2	2	4	6	4	0
GD	2	8%	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GPL	2	8%	4	4	4	4	6	6	6	6	-2
GAF	14	56%	12	12	14	16	16	16	19	17	2
TOTAL	25	100%	24	24	28	29	32	34	41	36	1

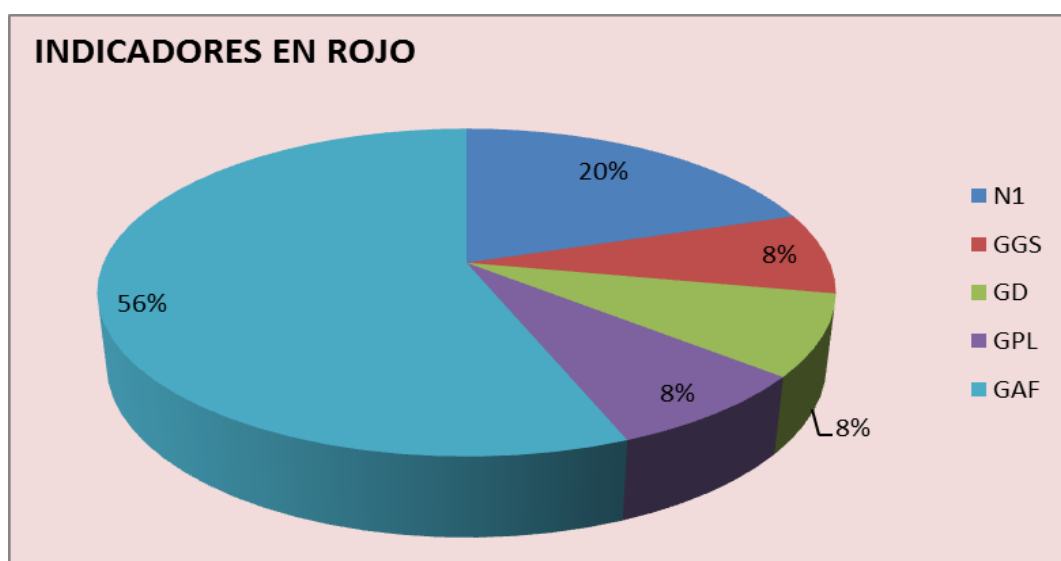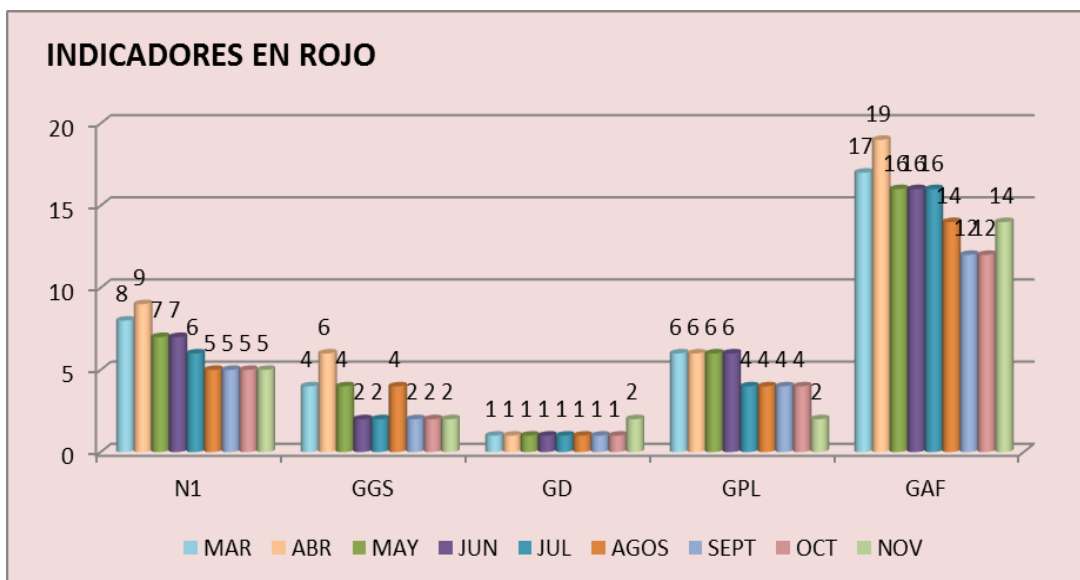


ESTADO DE PROCESOS

Procesos por área

La EEQ ha registrado 102 procesos en GPR, de los cuales 47 pertenecen al grupo de procesos sustantivos y 55 a los procesos adjetivos, según la siguiente distribución por área:

ÁREA	PROCESOS	%
GGS	7	7%
GD	16	16%
GC	10	10%
GPE	6	6%
GPL	17	17%
GAF	27	26%
DCS	7	7%
DPSA	7	7%
PR	5	5%
TOTAL	102	

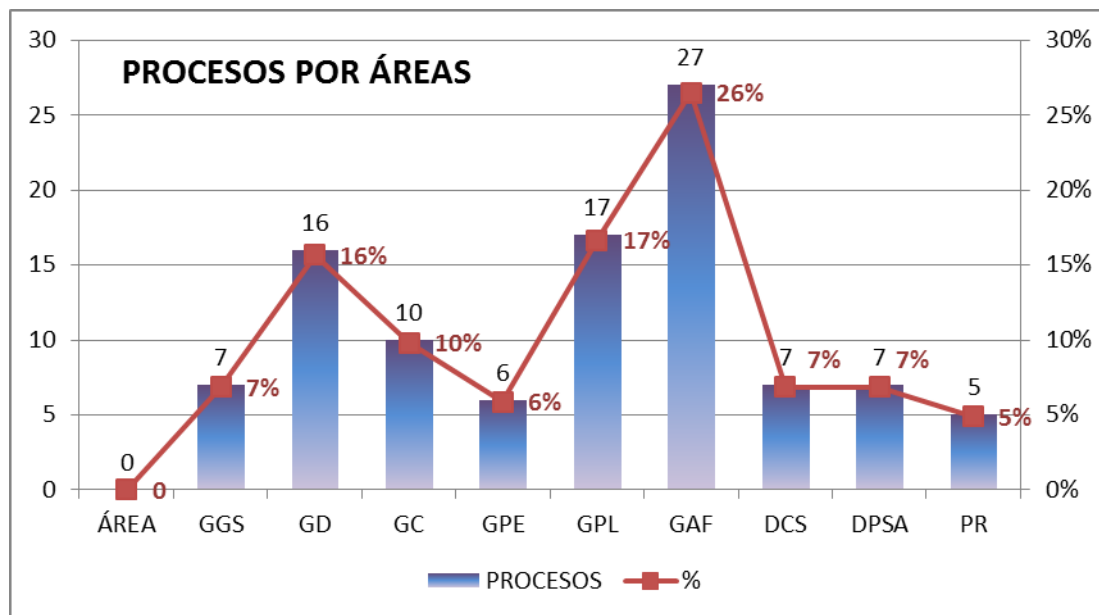

Procesos comatosos

El Artículo 29 de la Norma Técnica de Implementación y Operación de Gobierno por Resultados, en el Capítulo 7 – De la gestión y mejora de procesos indica lo siguiente:

“Procesos de alta importancia y bajo desempeño: los procesos evaluados de GPR con importancia alta o vital y desempeño actual de bajo o muy bajo serán los procesos prioritarios

para mejorar. Los responsables de procesos, junto con el Director o Titular de la unidad deberán determinar la priorización y selección final de procesos a mejorar”













El resumen de procesos de la herramienta GPR presenta la siguiente situación:

- 20 procesos de importancia vital, de los cuales 7 tienen desempeño bajo.
- 66 procesos de importancia alta, de los cuales 25 tienen desempeño bajo y 1 muy bajo.

Es decir se reporta un total de 33 procesos comatosos, que representan el 32.35% de un total de 102 procesos de la Empresa.










En los procesos adjetivos encontramos 25 procesos comatosos, que representan el 45.45% de un total de 55 procesos, mientras que los procesos sustantivos tenemos 8 procesos comatosos que representan el 17% de un total de los 47 procesos.

El gráfico muestra el resumen de evaluación de procesos que presenta la herramienta GPR:

DESEMPEÑO	IMPORTANCIA					Total
	Nula	Baja	Media	Alta	Vital	
Excelente			1 	2 		3
Muy bueno			2 	2 	4 	15
Bueno			6 	29 	2 	44
Bajo			2 	25 	2 	39
Muy bajo				1 		1
Total			16	66	20	102
Comatosos				26	7	33 32.35 %

Procesos Evaluados: 102
 Procesos No Implementados: 0
 Procesos No Evaluados: 0
 Total: 102

Año: 2014 ▼
 Tipo de Proceso: Adjetivo ▼
 Seleccionados para Mejora: Indistinto ▼












DESEMPEÑO	IMPORTANCIA					Total
	Nula	Baja	Media	Alta	Vital	
Excelente						
Muy bueno			2 	5 	3 	10
Bueno			5 	6 	2 	13
Bajo			1 	19 	6 	32
Muy bajo						
Total			14	30	11	55
Comatosos				19	6	25
						45.45 %

Procesos Evaluados: 55
 Procesos No Implementados: 0
 Procesos No Evaluados: 0
 Total: 55

Año:

Tipo de Proceso:

Seleccionados para Mejora:

DESEMPEÑO	IMPORTANCIA					Total
	Nula	Baja	Media	Alta	Vital	
Excelente			1 	2 		3
Muy bueno			1 	4 	1 	6
Bueno			1 	22 	2 	30
Bajo				6 	1 	7
Muy bajo				1 		1
Total			3	35	9	47
Comatosos				7	1	8
						17.02 %

Procesos Evaluados: 47

Procesos No Implementados: 0


Procesos No Evaluados: 0

Total: 47

En el gráfico se observa 33 procesos cotamosos clasificados por áreas, siendo Gerencia de Planificación y la Dirección de Participación Socio Ambiental las más altas, con el 27% y el 16% respectivamente.

Por lo tanto, se deben hacer las acciones pertinentes para mejorar la importancia y el desempeño de los procesos comatosos reportados.

Cabe indicar que no tienen proyectos alineados a los procesos comatosos, la Gerencia de Planificación, Gerencia Administrativa Financiera y Procuraduría.

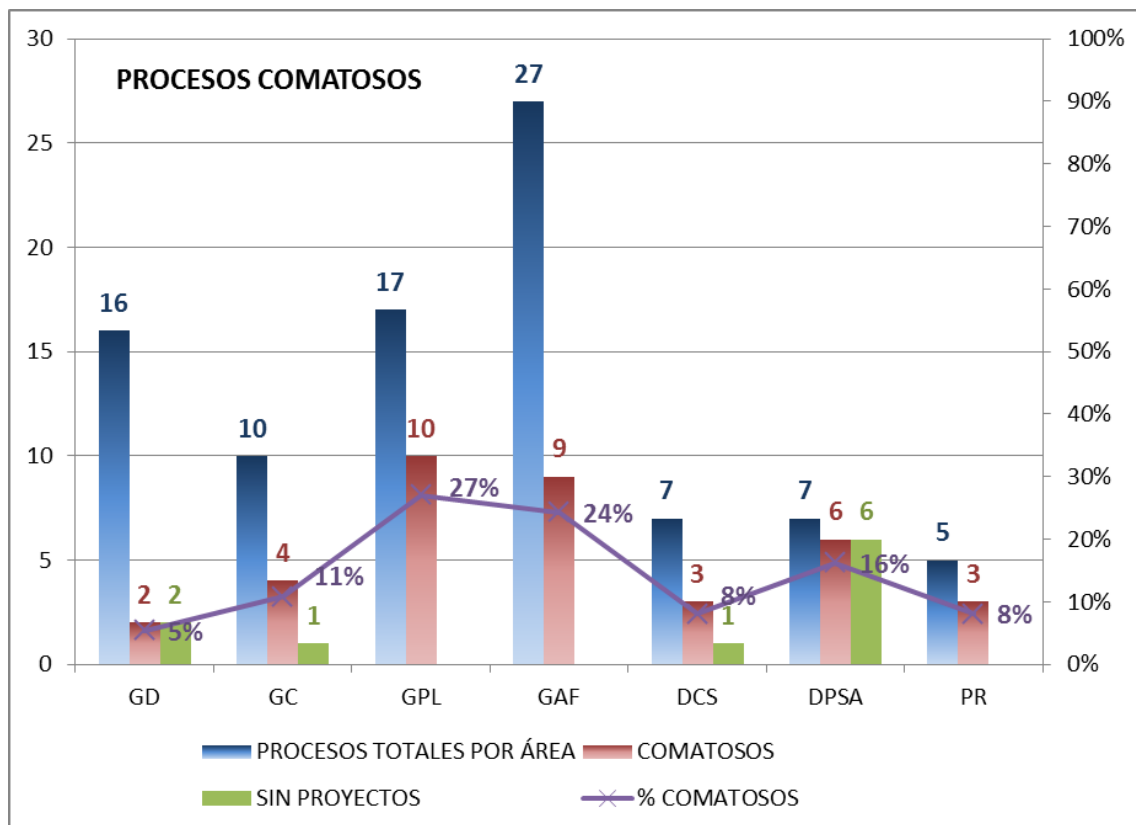


RESUMEN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

A continuación se presenta un resumen del desempeño de la organización, que se obtiene mediante el Visor de Gestión de la herramienta GPR y corresponde al período agosto 2014 del Plan Comprometido Anual.

Objetivos e Indicadores

- Nivel de cumplimiento: 100% en la carga de información.
- Nivel de cumplimiento: 100% en la actualización de indicadores.
- Nivel de desempeño de indicadores: 73% de indicadores cumplen la meta, el 10% se aleja de la meta y el 17% no alcanza la meta en el período.

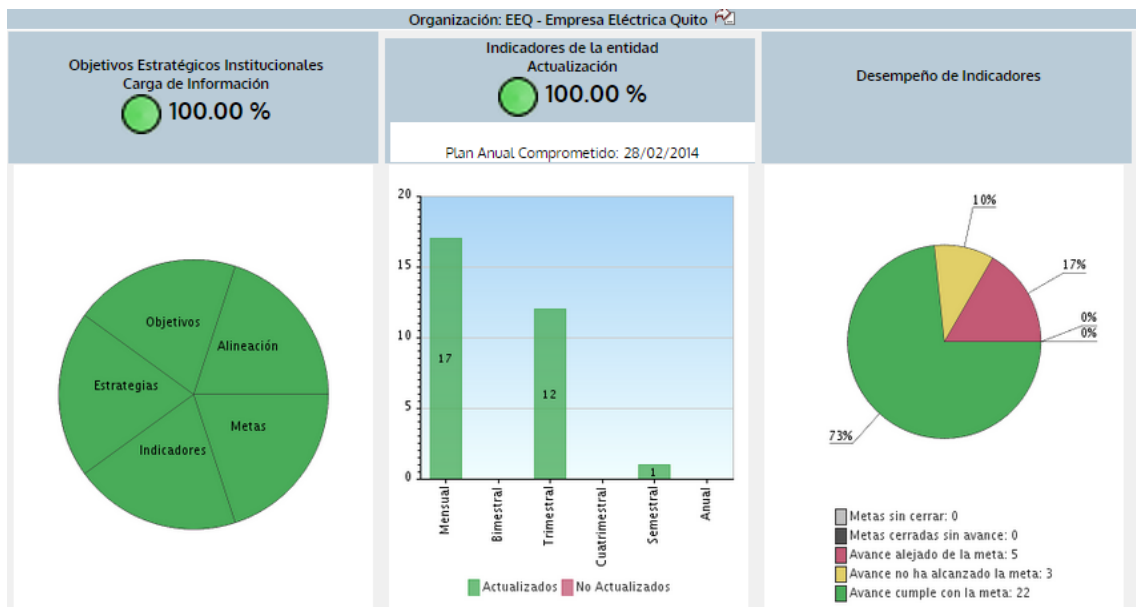

Proyectos de Inversión


- Nivel de cumplimiento: 100% en la carga y 66.67% en actualización de la información.
- Nivel de desempeño: avance físico del 100%
- Nivel de desempeño: avance financiero del 100%
-



En el mes de noviembre los proyectos de inversión reportan un avance físico y financiero del 100% dentro del programado. Los indicadores por su parte registran el 83% con resultados que cumplen la meta y el 17% con resultados que se alejan de la meta fijada.

Proyectos de Gasto Corriente

- Nivel de cumplimiento: 100% en la carga de información
- Nivel de cumplimiento: 86.18% en la actualización de la información.
- Nivel de desempeño: avance físico del 99.89% < a la meta.
- Nivel de desempeño: avance financiero del 52.86% < a la meta.

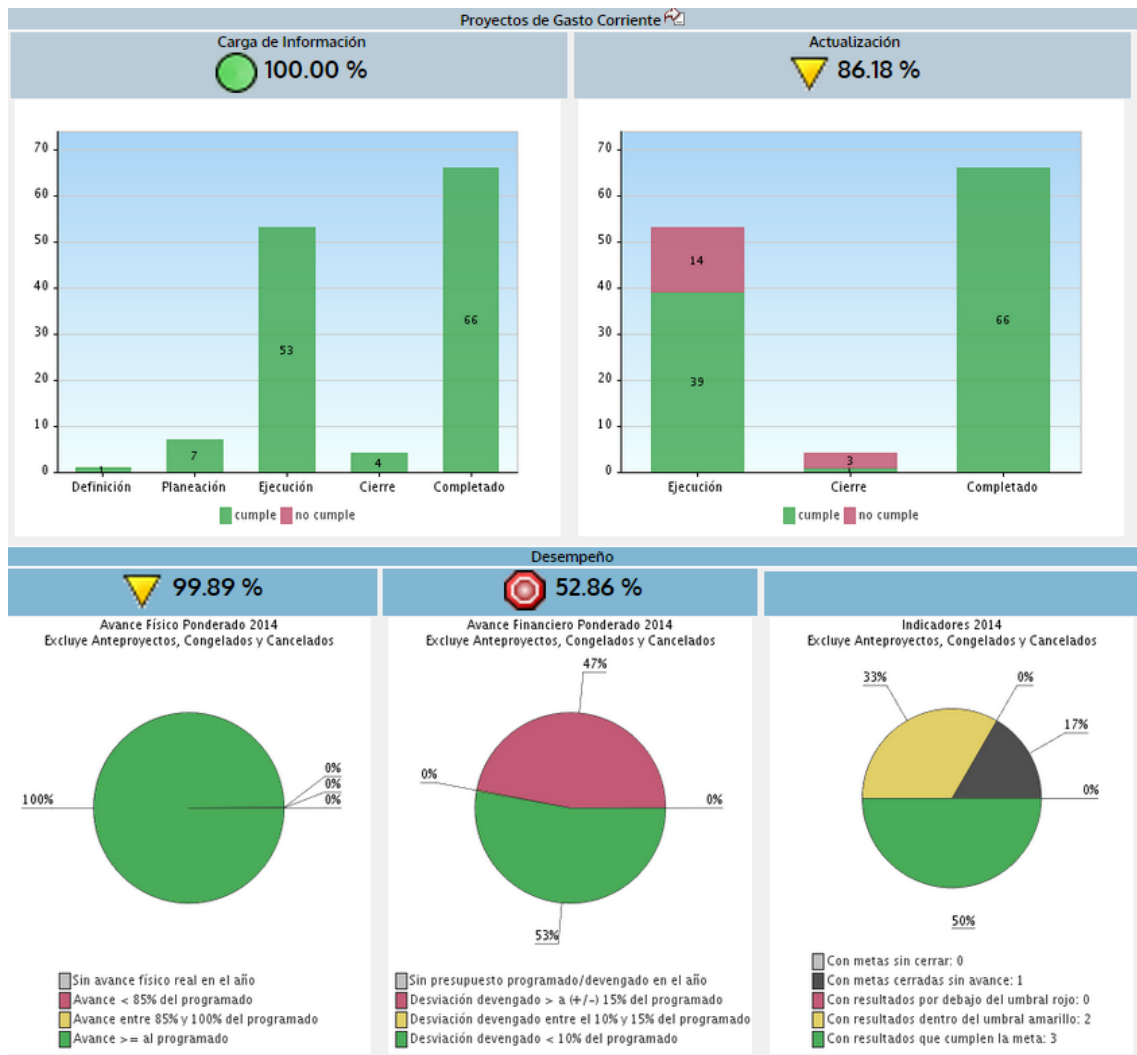

El avance físico de los proyectos de gasto corrientes tiene un cumplimiento del 100% de acuerdo a su programación, mientras que en el avance financiero un 47% de los proyectos tienen una desviación devengada mayor al 15% del programado y un 53% de los proyectos tienen una desviación devengada menor al 10%.

Los indicadores por su parte registran el 50% con resultados que cumplen la meta, el 33% con resultados que se desvían de la meta fijada y el 17% con metas cerradas sin avance.

Gestión de los Procesos

Procesos Sustantivos

- Nivel de cumplimiento: 100% en la carga y actualización de información
- Nivel de salud: 82.98% < al rango aceptable.

Procesos Adjetivos

- Nivel de cumplimiento: 100% en la carga y actualización de información
- Nivel de salud: 60% < al rango aceptable.



RECOMENDACIONES

- Es necesario analizar el incremento de los proyectos en riesgo que se produce en este mes y tomar las acciones pertinentes para disminuir esta situación.
- Por su parte los proyectos de gasto corriente registran un avance financiero del 52%, también se deben realizar acciones pertinentes para mejorar su nivel.
- El Equipo Metodológico debe mantener el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Norma Técnica GPR.
- La Gerencia de Planificación, a través del Líder Metodológica debe coordinar con las áreas para cumplir con los requerimientos de GPR.
- Cada área debe ejecutar las acciones pertinentes para mejorar la situación de los proyectos en riesgo e indicadores en rojo o amarillo.
- El Equipo Metodológico debe realizar seguimiento al cumplimiento de acciones planteadas por las áreas sobre el estado de indicadores y proyectos.
- Las áreas deben realizar las acciones más idóneas para mejorar la situación de los procesos comatosos.
- Las áreas deben plantear proyectos de mejora para los procesos comatosos que no tienen alineados proyectos.
- El Equipo Metodológico debe realizar seguimiento al cumplimiento de los proyectos de mejora de procesos.
- El Equipo Metodológico debe realizar seguimiento a las acciones para mejorar el grado de cumplimiento del avance de los proyectos y de los indicadores
- Se requiere el monitoreo constante de los líderes de cada proyecto y de los miembros del Equipo Metodológico para identificar acciones de mejora oportunamente.
- Facilitar oportunamente la información a fin de realizar una adecuada sistematización y presentación del informe.
- Realizar reuniones periódicas de trabajo con todos los involucrados a fin de mejorar aspectos conceptuales y formales de la presentación del informe.

María Judith Villegas
LÍDER METODOLÓGICA GPR
DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
